




**BYMUSEET.**

# **Brannen på St. Jørgen - erfaringar og utfordringar**

**Anne Bjørke, samlingsleiar  
FORK-seminar, 15. desember 2015**

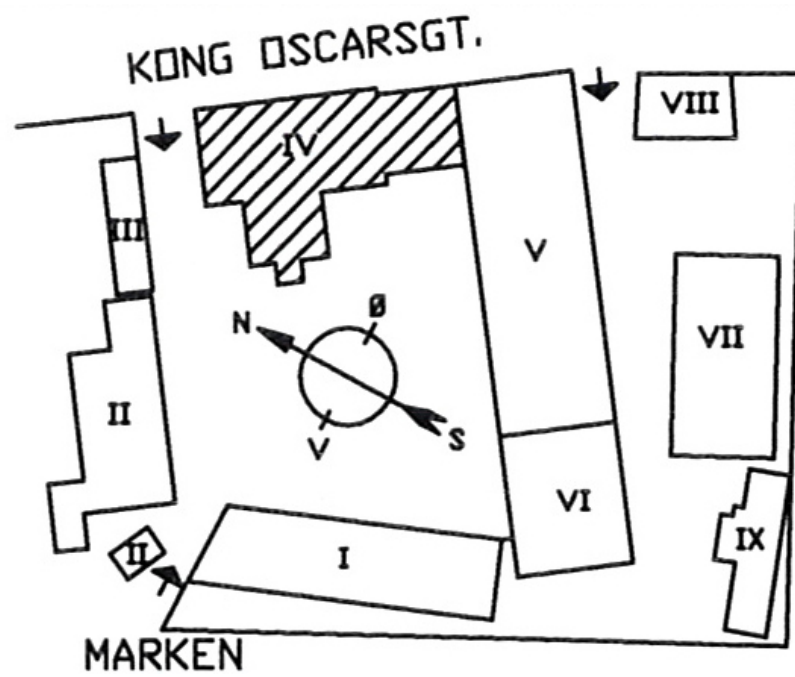









17

Ma minne Herrens Blod. Jeg her ved Herrens Altar fød  
Et lagedont vil Samle op. for min Speedalsche Sjæl og Frop.

35









# Skadereduserende faktorar

- God deteksjon
- Direkte varsling
- Sprinkleranlegg
- Brannvesenets innsats
- Flaks...
  - Vindstille
  - Kort utrykningstid
  - Døgnbemanna brannstasjon med god kapasitet
  - Relativt god tilkomst for bilar og materiell

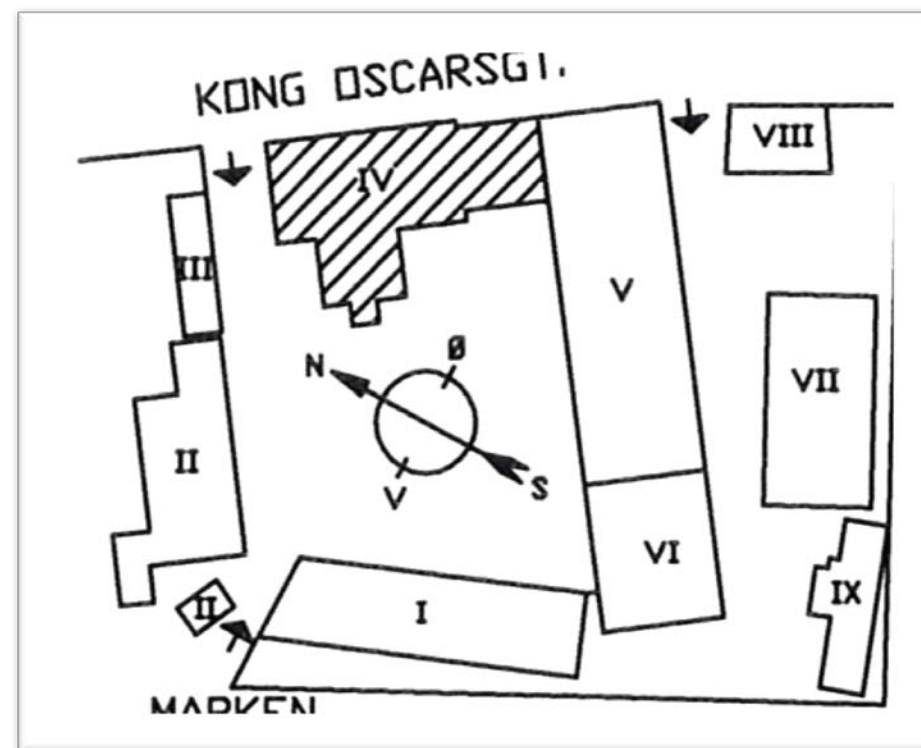










Foto: J. Buder orgelverksted









# Dei første dagane etter brannen


- Kven skal ha hovudansvaret for kva internt?
- Klarsignal frå forsikringsselskap
- Intern informasjon
- Mediehandtering
- Kva trengs skaffast av utstyr/hjelpemiddel?
- Kva fagpersonar kan hjelpe med kva?
- Samarbeid med forsikringsselskap

# Arbeid utført

- Mange ulike firma og institusjonar involvert:
  - Coor Hokksund: Sotsanering og reingjering av udekoreerte/malte flater
  - Coor Bergen: Opptørking og avfukting
  - Lavtox og Cyttox i samarbeid: Klimaovervåkning og avfukting
  - Inn AS: Diverse bygningsarbeid
  - Tore Eide AS: Sprinklersystem
  - Knutsen AS: Elektroarbeid
  - Gullaksen: Stillasarbeid
  - Universitetsmuseet i Bergen: Malerikonservering
  - K. Scharffenberg/A. Milnes: Malerikonservering
  - J. Derry/ A.C. Hagen: Trekonservering
  - Bevaringstenestene: Tekstilkonservering





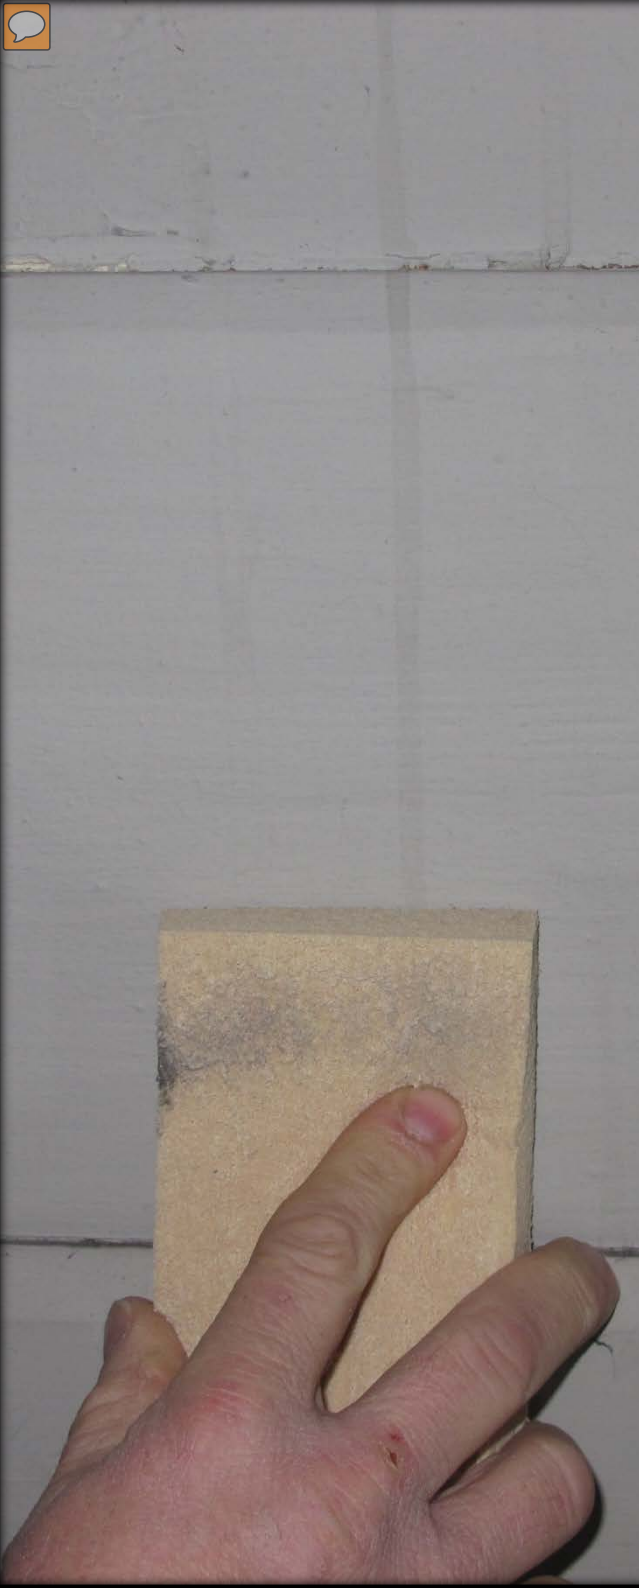







# Nokre av erfaringane

- Komplisert koordinering av alle dei ulike aktørane
- Gull verdt å ha ein ansvarlig person på staden
- Avfukting er tricky...
  - kor raskt skal ein satse på å seinke RF?
  - kva firma kan fuktkontroll?
- Uhyre mykje tid til administrasjon av arbeidet
  - ikkje dekkja av forsikringa
  - må få høg prioritet kontra andre planlagde oppgåver
- Gjerne ikkje så gale at det ikkje er godt for noko...

